

SOPM-0942-GVU-16

Manizales, 02 de mayo de 2016


Señor  
ANDRES CAMILO ARIAS BEDOYA  
Carrera 1 No. 48 D - 54  
Manizales


Asunto: -Oficio GED 12963-16

En visita técnica realizada por parte de personal de la Secretaría de Obras Públicas más arriba del control de buses barrio San Sebastián, se pudo observar un tramo de vía que carece de carpeta de rodadura en el empalme con el pavimento nuevo. Por tal motivo se incluirá este sitio en el inventario de necesidades viales de la ciudad que será atendido de acuerdo con un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para futuras vigencias fiscales.

Así mismo para mejorar la movilidad procederemos a realizar una nivelación con material granular en el punto de empalme, en la presente vigencia.

Atentos a cualquier sugerencia.

  
CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Obras Públicas

  
JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ  
Profesional Universitario  
Secretaría de Obras Públicas



**ALCALDÍA DE MANIZALES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
FORMATO DE VISITA TÉCNICA**

OP-OP-OP-FR-07

Rad 143

Solicitantes: ANDRES CAMILO ARIAS BEDOYA

**FECHA: ABRIL 28- 2016**

Dirección: CARRERA 1 CALLE 48D-54

Teléfono: 3173188278

Barrio: SAN SEBASTIAN


Nombre del Funcionario Asignado: LESLIE LOAIZA ALZATE

Lugar de la visita: CONTROL DE BUSES HACIA ARRIBA

**OBSERVACIONES DE LA VISITA**

En atención a solicitud GED 12963 -16, se realiza visita a la dirección mencionada, observando tramo de vía que carece de capa de rodadura en el empalme con el pavimento nuevo, lo cual impide el tráfico de vehículos hacia la parte alta, sobretodo vehículos de servicio público.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

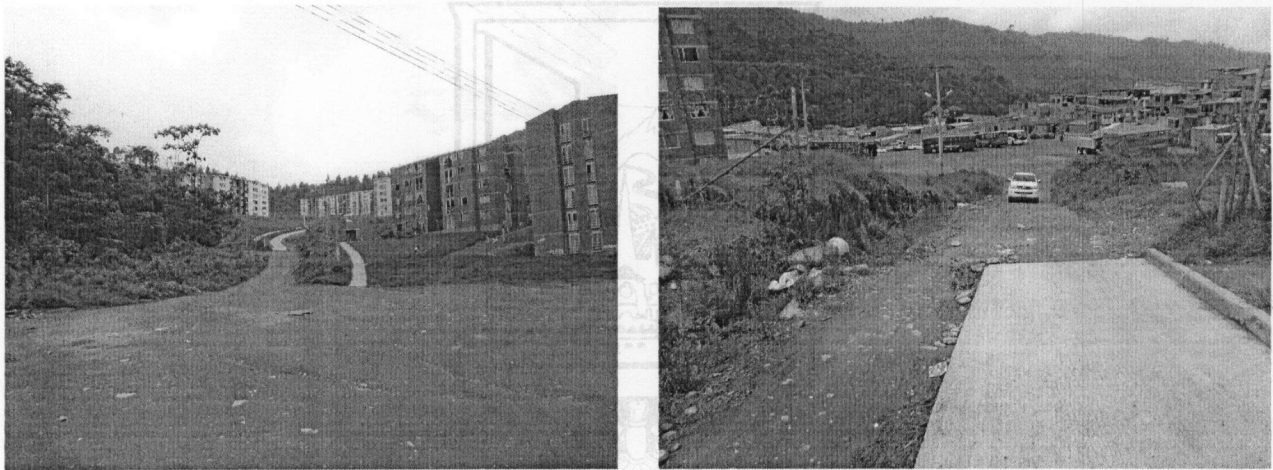

Área de pavimento solicitado: 280 M2 aproximadamente

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda incluir en el inventario de necesidades viales de la Secretaría de Obras Públicas, la construcción del pavimento en el sitio en mención, el cual se desarrolla de acuerdo a un orden de prioridades y a los recursos con que se cuente para próximas vigencias fiscales.

Con el fin de dar mayor movilidad al servicio público, se recomienda realizar una nivelación con material granular en el punto de empalme con el pavimento nuevo existente.

Elaborado por: **LESLIE LOAIZA ALZATE**  
**TECNICO GRUPO DE VIAS**

Leslie L.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
